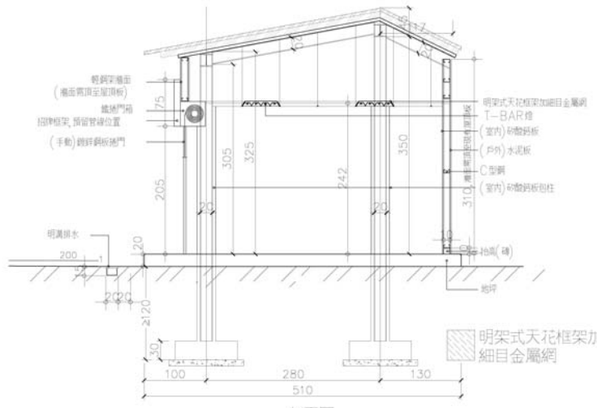
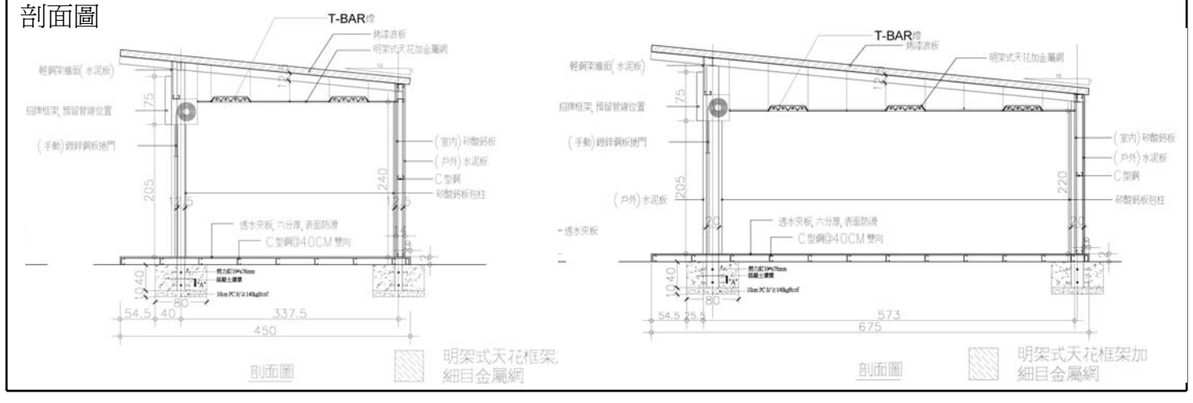
3-2-4長亭安置區攤位安置平面配置計畫

基地內現有長亭並無建築執照，且木造結構已損壞不堪使用。


本案拆除重建此長亭，做爲銷售區興建時期之73攤商安置營運使用。

長亭依使用類型分爲永久型及臨時型，永久型長亭安置47座攤商，於主體建物施工結束之後，攤商結束安置進駐新建銷售區後，回復爲長亭休憩廣場用，其材料亦爲耐候性鋅鋁屋頂及輕鋼構結構系統。

臨時型長亭安置26座攤商，於主體建物施工結束之後，攤商結束安置進駐新建銷售區後，拆除並復原爲長亭廣場鋪面及綠化，其材料爲一般烤漆浪板屋頂。

圖例	類型	數量	尺寸	說明
	永久性	47	300X510cm	於安置期結束後將隔間、設備拆除，留下構架作爲涼亭使用
剖面圖 				
	臨時性	26	300X450cm 400X675cm	於安置期結束後全數拆除，原位置還原作爲廣場使用
剖面圖 				

一.長亭安置時期配置

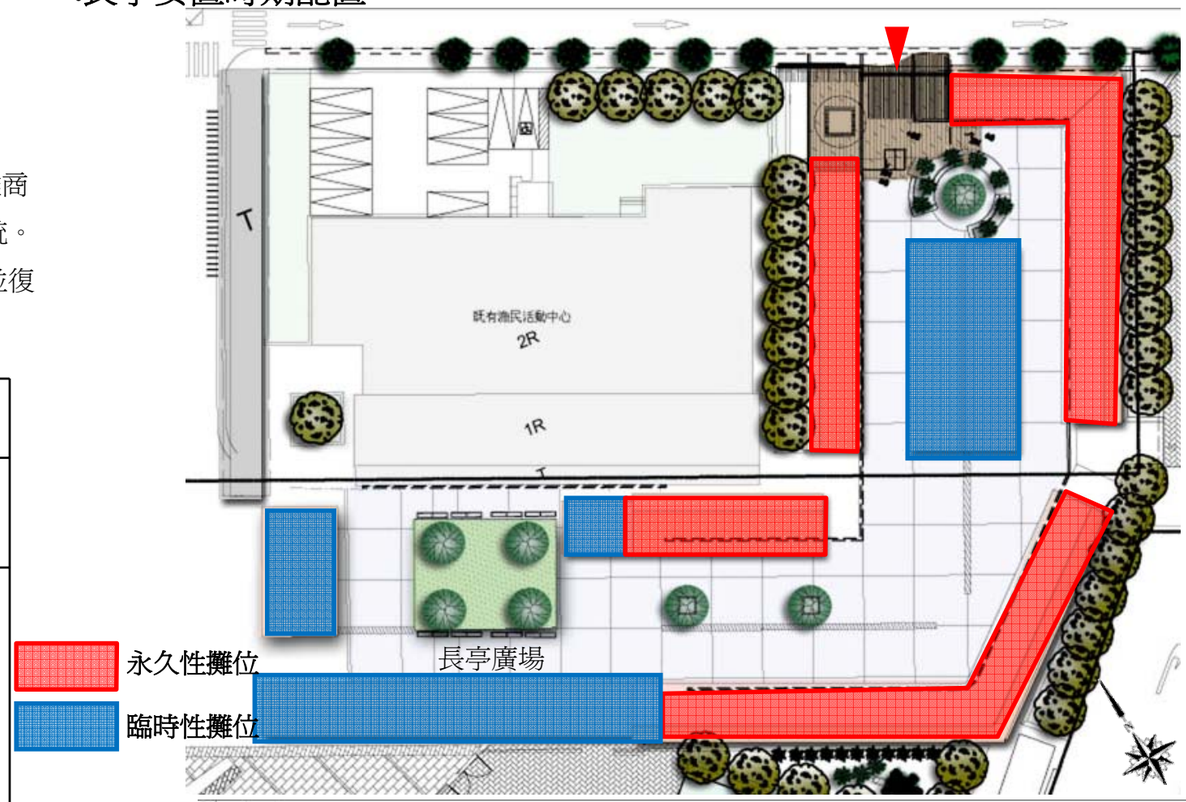

二.長亭復原後景觀配置

